
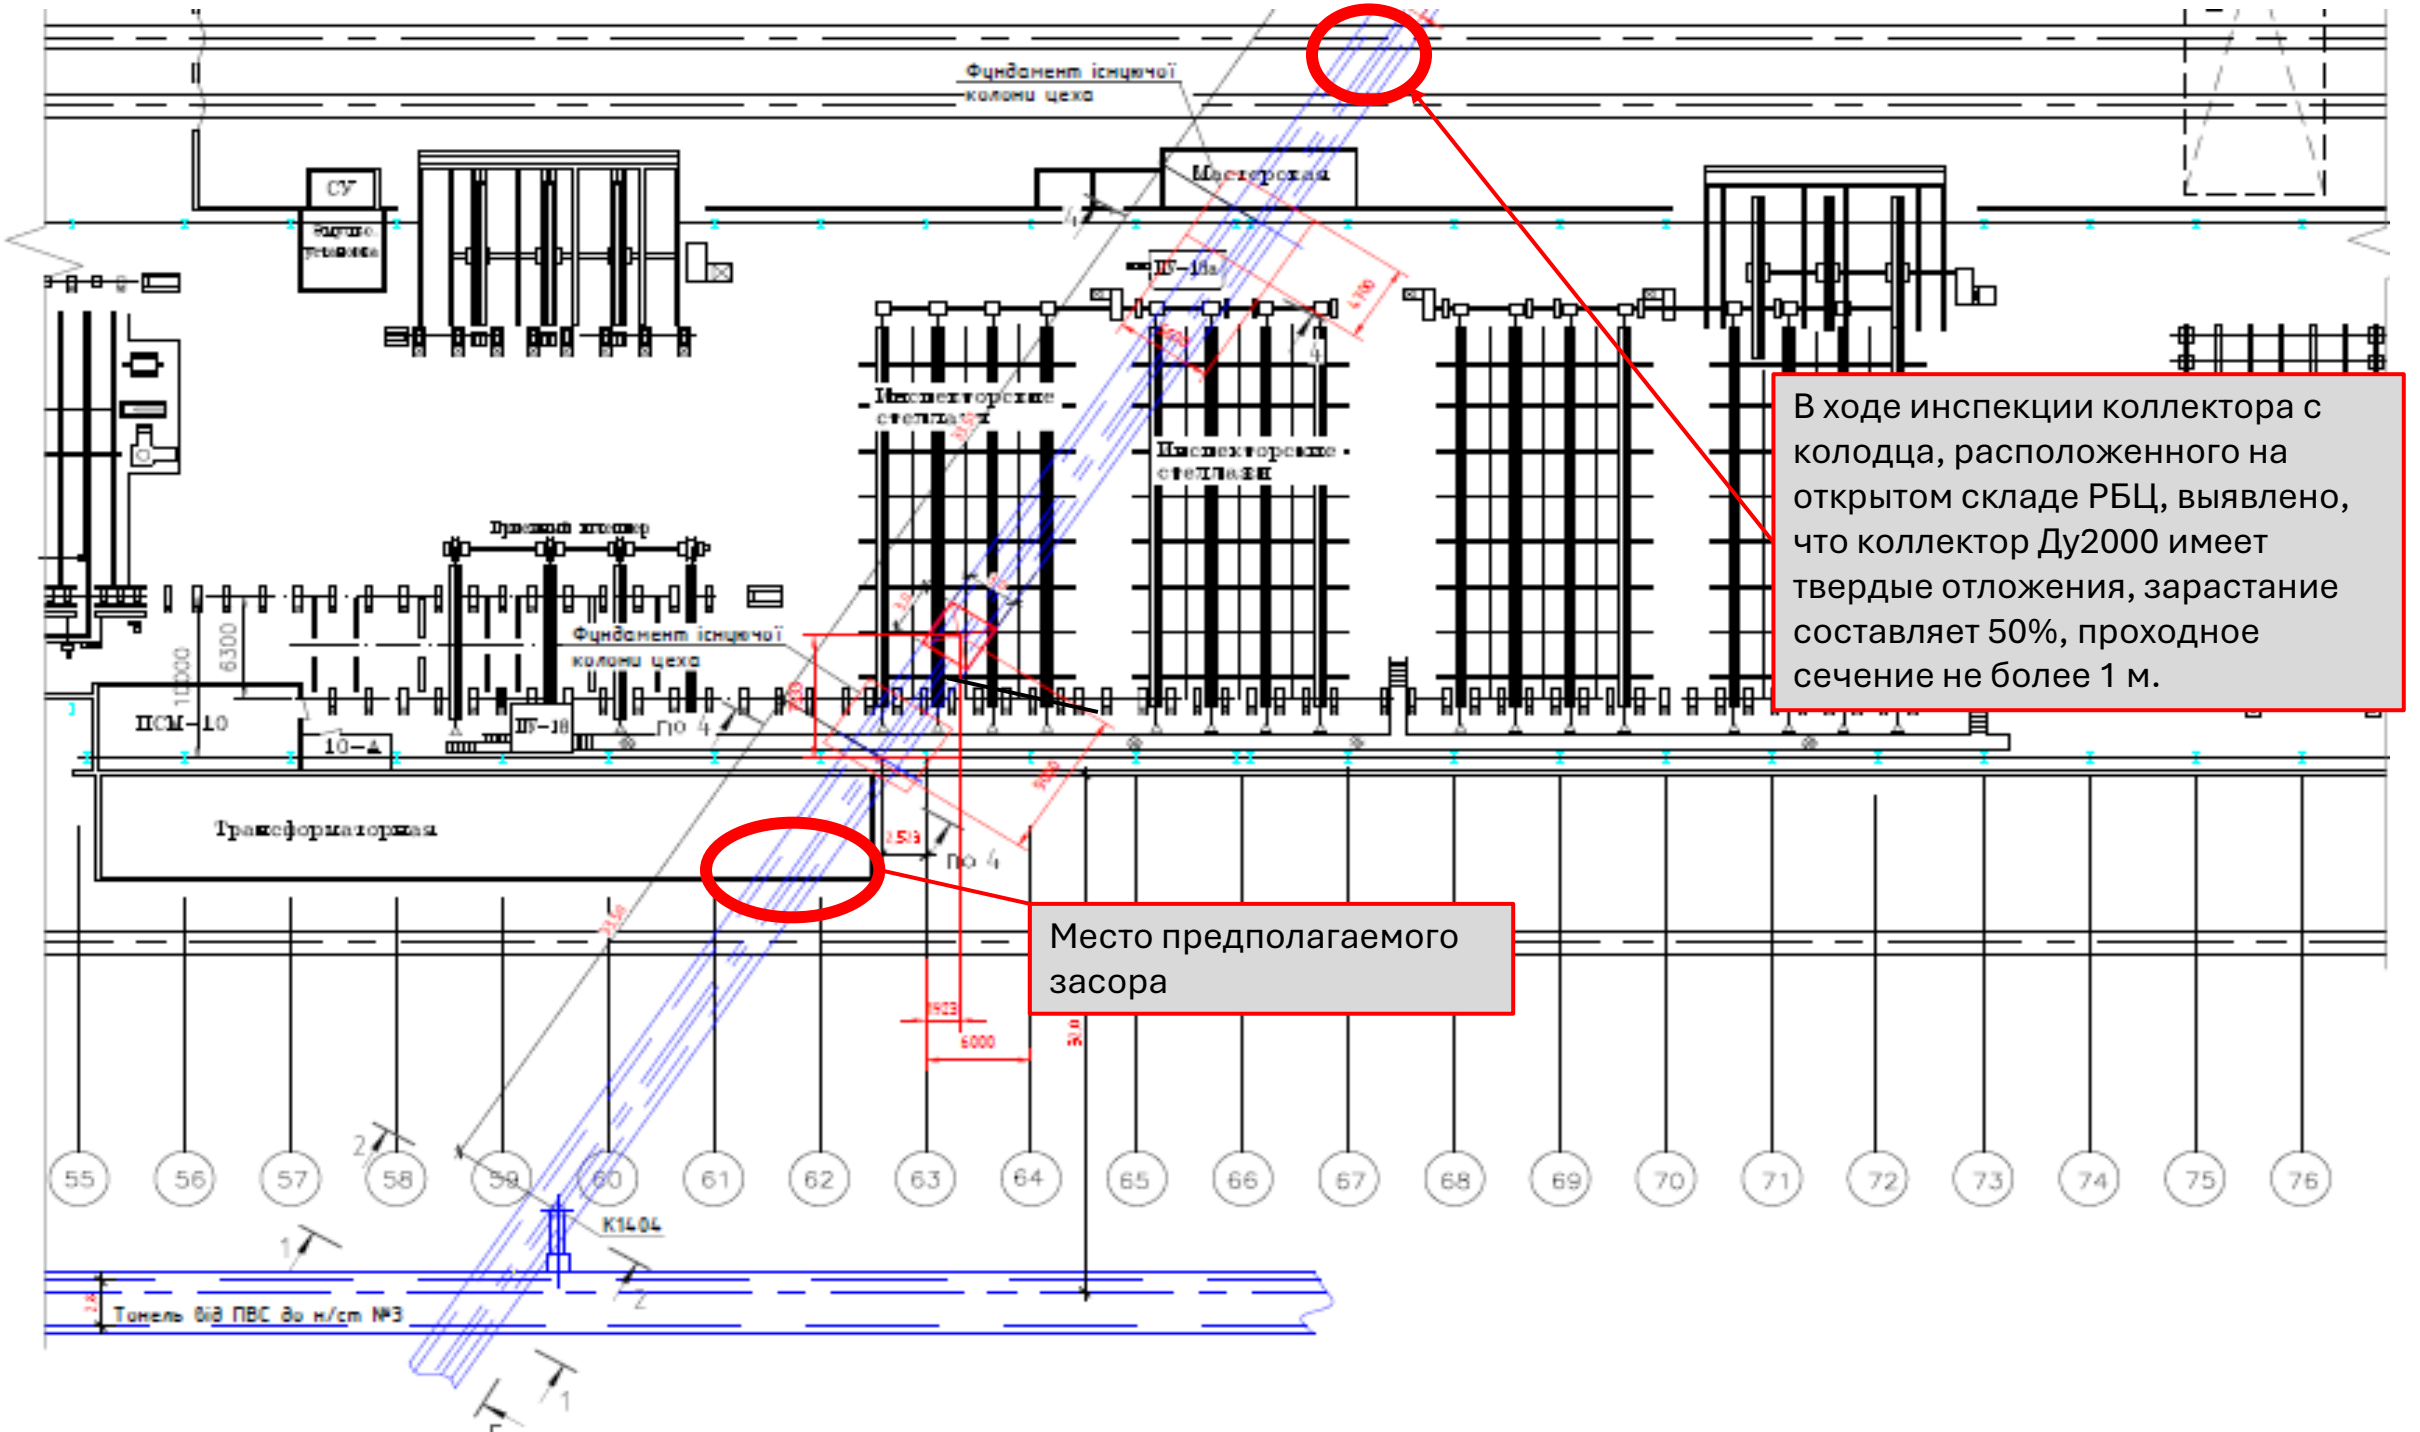


В ходе инспекции коллектора с колодца, расположенного на открытом складе РБЦ, выявлено, что коллектор Ду2000 имеет твердые отложения, зарастание составляет 50%, проходное сечение не более 1 м.

Место предполагаемого засора

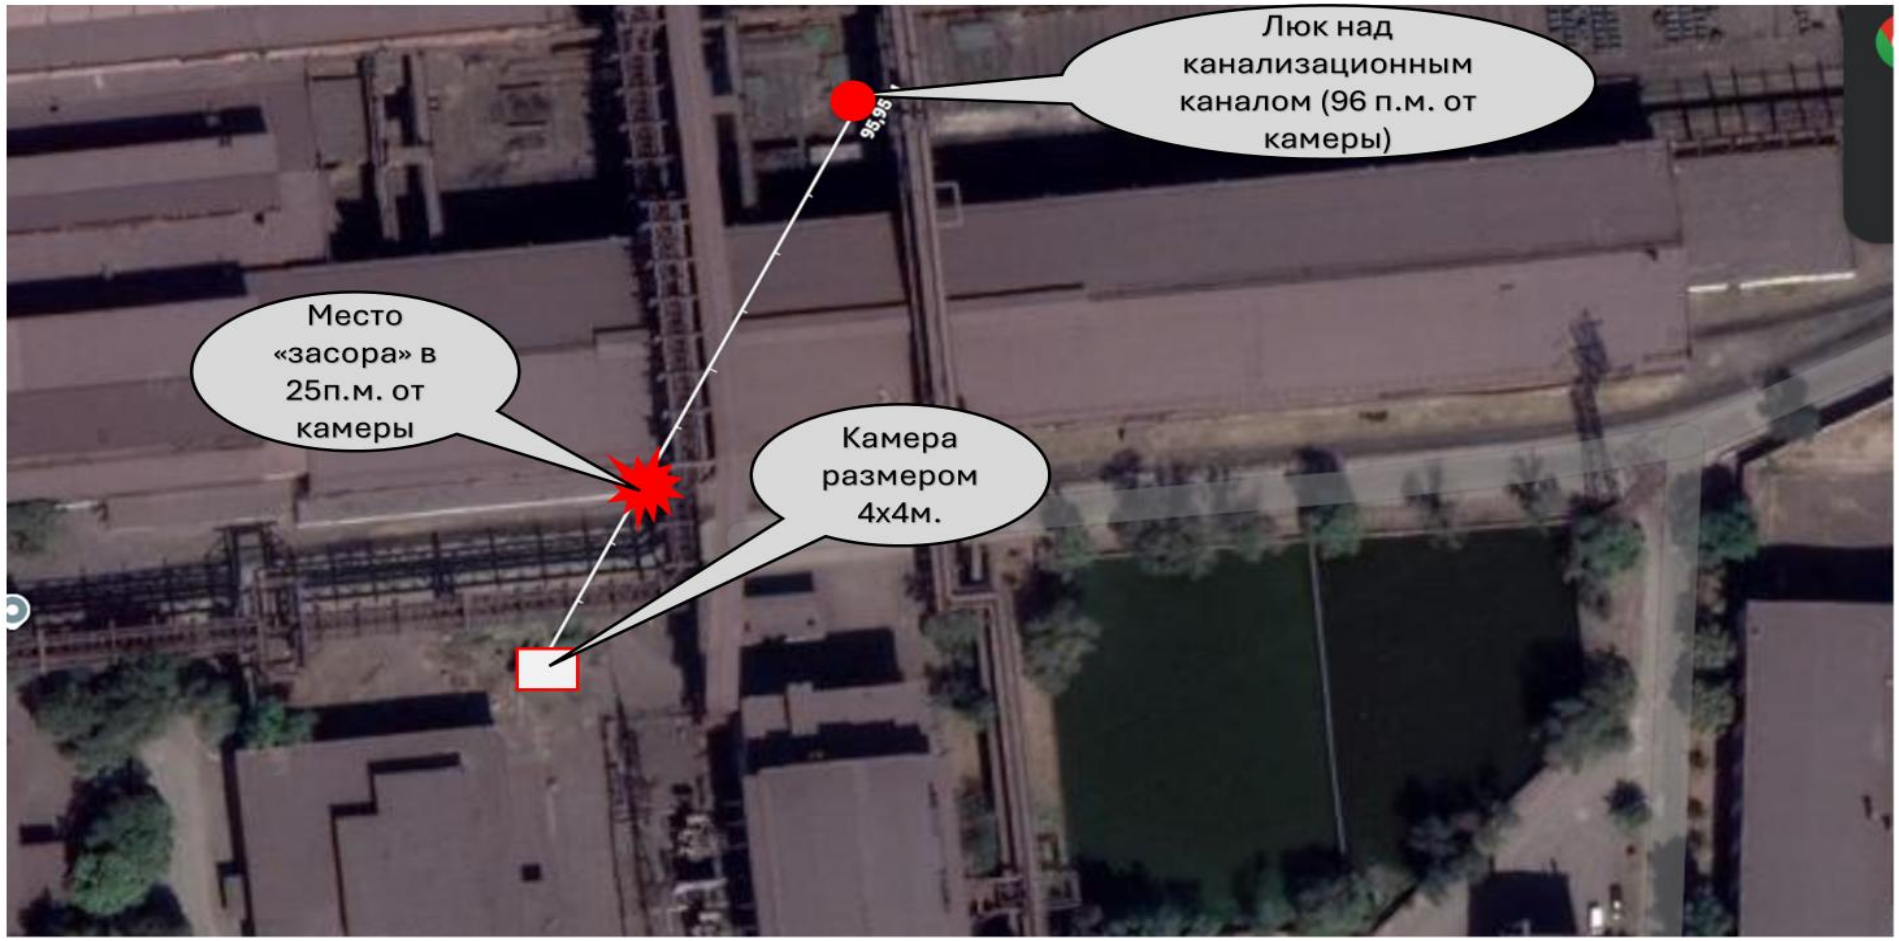

Из-за зарастания отложениями общезаводского коллектора промышленных стоков Ф2000 под зданием РБЦ, отсутствует возможность откачки производственных стоков через общезаводской канализационный коллектор на н/ст №8А и далее в пруд-осветлитель.
